Türkiye Cumhuriyeti
Giresun Üniversitesi

2020 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2021

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 2

1. GENEL DEĞERLENDİRME 3

1.a)Misyon 3

1.b) Vizyon 3

1.c)Değerlerimiz 3

1.d) İlkelerimiz 4

1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 4

1.1.ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI 6

1.1.a) Finansman Kaynaklar 6

1.1.b) Gelirlerimiz 7

1.1.c) Yasal Dayanaklar 7

1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 9

1.2.1. İnsan Kaynakları 15

1.2.2.Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyinde Dağılımı 17

1.3.2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI// KALİTE ARTIŞI// İYİLEŞME 18

1.4. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 18

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 22

2.1. DEVAM EDEN PROJELER 23

2.1.1.a). Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 23

2.1.1.b) Kampüs Altyapısı Projesi 24

2.1.2. Özel Sektör Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler 24

2.2. TAMAMLANAN PROJELER 24

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu 25

2.2.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 25

2.2.2.2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 26

2.2.2.3. Muhtelif İşler Projesi 27

2.2.2.4. Yayın Alımı Projesi 31

3. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 35

4. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 37

SUNUŞ:

Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaştırılması kapsamında, 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5467 sayılı kanunla, 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek 65'inci madde ile kurulan Üniversitemiz 2020 yılında, 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Üniversitemizin 2020 yılındaki yatırım projelerinde yer alan ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanunun 20'nci maddesi, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Yatırım projelerinin izlenmesi ve yetkili mercilerce değerlendirilmesi gayesiyle; Üniversitemizce yürütülen yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlığını taşıyan 25'inci ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Üniversitemizin 2020 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yılmaz CAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz, İlkelerimiz

1.a) Misyon:

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

1.b) Vizyon:

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.

1.c) Değerlerimiz

- Bilimsellik-Disiplinler Arası Yaklaşım-Evrensellik-Yenilikçilik-Yaratıcılık
- Paylaşımcılık-Çözüm Odaklılık
- Fırsat Eşitliği- Liyakat- Hakkaniyet
- Öğrenci Odaklılık
- Akademik Özgürlük
- Çevreye Duyarlılık Ve Toplumsal Yararlılık
- Katılımcılık
- Hukuka Ve Etik Değerlere Bağlılık
- Hesap Verebilirlik

1.d) İlkelerimiz

- Giresun Üniversitesi araştırma hizmetlerinde disiplinler arası yaklaşımı benimser; bilimsel, evrensel, yenilikçi ve yaratıcıdır.
- Giresun Üniversitesi, paydaşlarla ilişkilerinde çözüm odaklı ve paylaşımcıdır.
- Giresun Üniversitesi çalışanlarına fırsat eşitliği sunar, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlıdır.
- Giresun Üniversitesi eğitim hizmetlerinde öğrenci odaklıdır.
- Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.
- Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.
- Giresun üniversitesi yönetim süreçlerinde katılımcılığa önem verir.
- Giresun Üniversitesi hizmet süreçlerinde hukuka ve etik değerlere bağlıdır.
- Giresun Üniversitesi bütün hizmet süreçlerinde hesap verebilirlik ilkesine göre çalışmalarını yürütür.

1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Giresun Üniversitesi 2020 Stratejik Planında 5 stratejik amaç, 19 hedef belirlenmiştir.

Bu amaçlara ait hedefler aşağıda belirtilmiş olup, performans göstergeleri faaliyet raporları aracılığıyla izlenmekte, değerlendirilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ-1: Eğitim-öğretim faaliyetlerini güçlendirmek

HEDEF 1.1: Plan dönemi sonuna kadar öğrenci nicelik ve niteliğinin arttırılması.

HEDEF 1.2: Plan dönemi sonuna kadar yan dal ve çift ana dal programlarının niceliğinin ve niteliğinin artırılması

HEDEF 1.3: Plan dönemi sonuna kadar üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliğinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ-2: Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

HEDEF 2.1: Plan dönemi sonuna kadar Üniversiteye ilişkin memnuniyet oranlarının artırılması
HEDEF 2.2: Plan dönemi sonuna kadar akademik ve idari insan kaynaklarının niceliğinin artırılması
HEDEF 2.3: Plan dönemi sonuna kadar bilimsel faaliyetlerin artırılması
HEDEF 2.4: Plan dönemi sonuna kadar insan kaynaklarının niteliğinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ-3: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini güçlendirmek.

HEDEF 3.1: Plan dönemi sonuna kadar Disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması.
HEDEF 3.2: Plan dönemi sonuna kadar araştırma projelerinin geliştirilmesi
HEDEF 3.3: Plan dönemi sonun kadar Lisansüstü programları nitelik ve niceliğinin artırılması
HEDEF 3.4: Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli ulusal bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması.
HEDEF 3.5: Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması.

STRATEJİK AMAÇ-4: Toplumsal katkı sağlayacak hizmet ve ürünleri desteklemek

HEDEF 4.1: Plan dönemi sonun kadar toplumsal katkı sağlayacak etkinliklerin nitelik ve niceliğini artırmak.
HEDEF 4.2: Plan dönemi sonuna kadar Toplum ile üniversite arasında iletişimi arttıracak etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması
HEDEF 4.3: Plan dönemi sonuna kadar girişimcilik faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ-5: Fiziki mekân ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

HEDEF 5.1: Plan dönemi sonuna kadar fiziki mekan nicelik ve niteliğinin artırılması
HEDEF 5.2: Plan dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapının nicelik ve niteliğinin artırılması
HEDEF 5.3: Plan dönemi sonuna kadar Öğrenme Kaynaklarının niceliğinin artırılması
HEDEF 5.4: Plan dönemi sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması

1.1 ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI

1.1. a) Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

2020 yılı Bütçe Kanunu ile Giresun Üniversitesi bütçesine **198.151.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, bütçe uygulama sürecinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleriyle yılsonu toplam ödeneği **221.133.611,00 TL'**ye ulaşmış, yılsonu harcama miktarı **206.446.308,28 TL** olmuştur.

2020 yılı başlangıç ödeneğinin %74,21'ipersonel giderlerine, %11'isosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine, %7,87'si mal ve hizmet alım giderlerine, %2,25'i cari transferlere ve %4,64'ü sermaye giderlerine tahsis edilmiştir.

2020 yılı **Üniversitemiz Yatırım Programında** eğitim sektöründe yer alan toplam 6 adet proje için başlangıç ödeneği olarak **9.200.000,00 TL** kaynak ayrılmış olup, tamamının hazine yardımı ile finans**e** edilmesi planlanmıştır.

Yatırım Programı uygulama sürecinde**; 9.200.000,00 TL** olan başlangıç ödeneğine **11.675.000,00 TL** likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış ve yılsonu ödeneği **20.875.000,00 TL** olmuştur.Bu ödeneklerin **13.748.706,55TL**'si harcanmış ve Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) **6.860.057,99TL** avans verilmiştir.

Tablo-1 Yatırım Projelerinin Başlangıç, Yılsonu Ödenekleri ile Harcamaları

Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği (+/-)	Yılsonu ödeneği	Harcama	Oran (%)
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	3.780.000,00	+6.175.000,00	9.955.000,00	3.092.000,00	31,05
Kampüs Altyapı Projesi	1.500.000,00	+448.420,00	1.948.420,00	1.919.537,00	98,20
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	-63.420,00	36.580,00	36.580,00	100,00
Muhtelif İşler Projesi	2.420.000,00	+5.119.500,00	7.539.500,00	7.473.764,00	99,13
Yayın Alımı Projesi	1.200.000,00	-4.500,00	1.195.500,00	1.195.301,00	99,98
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	200.000,00		200.000,00	37.524,00	18,76
TOPLAM	9.200.000,00	+11.675.000,00	20.875.000,00	13.748.706,55	65,86

1.1.b) Gelirlerimiz:

I. Bütçe

A. Hazine Yardımı

B. Öz Gelirler

1. Kira Gelirleri
2. SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
3. İkinci Öğretim Gelirleri
4. Örgün Öğretim Gelirleri
5. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
6.

II. Döner Sermaye

III. Bütçe Dışı Kaynak

A. TÜBİTAK

B. AB

C. Farabi

D. Şartlı Bağış ve Yardımlar

1.1.c)Yasal Dayanaklar

2547 Sayılı Kanunun;46'ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri,

43'üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,

55'inci maddesine göre, üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...",

58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri,

Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,

Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun7'nci maddesi,

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan teminatların irat kayıtları,

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40'ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Tablo.22020 Mali Bütçe Gelirleri (TL)

Açıklama	Planlanan Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.532.000,00	6.298.905,94	96,43
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	180.174.000,00	193.063.950,00	107,15
Diğer Gelirler	11.445.000,00	5.992.716,28	52,36
TOPLAM	198.151.000,00	205.355.572,22	103,64

Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Dağılımı

Grafik.1

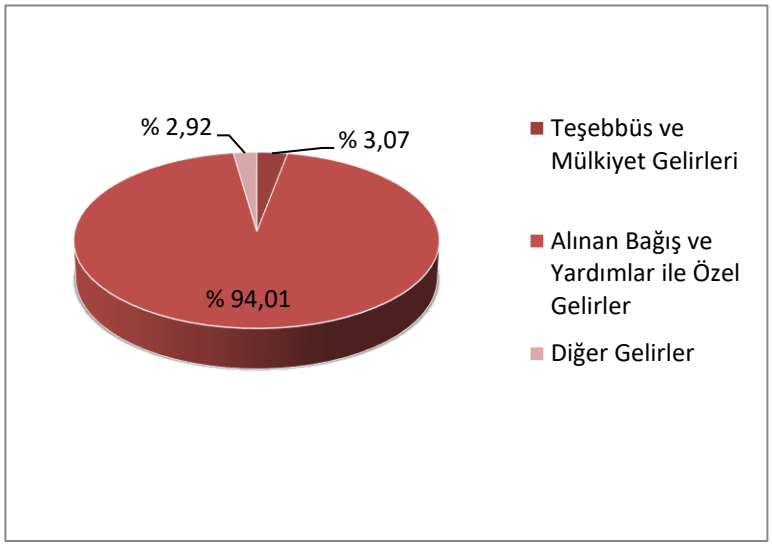

Üniversitemizin 2020 yılında bütçe geliri **198.151.000,00 TL** olarak öngörülmüş, yıl içinde yapılan 7.204.572,22 TL ödenek eklenmesi sonucunda toplam ödenek **205.355.572,22TL**'ye ulaşmış ve bu ödenekle **206.446.308,28TL** harcama gerçekleşmiştir.

1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2020 yılsonu itibarıyla 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Giresun Üniversitesi Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkeleriyle **822.149,52m^2**arazi yüzölçümü ve **201.152,93m^2** yapı alanına sahiptir.

Kale Mevkiinde yer alan Rektörlük binası bünyesinde Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü bulunmaktadır.

Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Rektörlük Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,Spor Bilimleri Fakültesi,İslami İlimler Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölüm Başkanlıkları, Engelli Öğrenci Birimi, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRUMLAB)ile Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi(TÖMER),Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, AB Erasmus Ofisi, Ar-Ge Koordinatörlüğü, personel ve öğrenci yemekhaneleri ile açık spor alanları, merkez kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir.

Yatırım Programı kapsamında Muhtelif İşler Projesinin Gayrimenkul Bakım Onarım projesi ödenekleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası altında 1000 öğrenci kapasiteli öğrenci yemekhanemiz oluşturulmuştur.

Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kapalı spor salonu, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır.

Şehir merkezimizde bulunan bir diğer yerleşkemiz de Nizamiye yerleşkesidir.Diş Hekimliği Fakültesi bu yerleşkemizde konuşlanmıştır.

Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Okulumuzun bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuvarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.

Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Bulancak, nüfus itibariyle Giresun ilinin en büyük ilçesidir.Ayrıca bu ilçede konumlanması planlanan Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2017 yılında kurulmuştur.

Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ilçemizde, Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde, Keşap Meslek Yüksekokulu, Turizm sektörüne yönelik üst düzey eleman yetiştirecek olan Turizm Fakültesi Keşap ilçemizdedir. Ancak Dereli ilçemizde faaliyet gösteren Dereli Meslek Yüksekokulu 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinden zarar görmüş ve yıkılmıştır. Bu bağlamda eğitim-öğretim faaliyetlerini geçici olarak Turizm Fakültesi binasında yürütmektedir.

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele ilçesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Piraziz Meslek Yüksekokulu Piraziz ilçesinde yer almaktadır.

Piraziz Meslek Yüksekokulu, 20/04/2016tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı 2547 sayılı Yasa'nın 2880 sayılı Yasayla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır.

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar ilçe merkezinde yer almaktadır. Yerleşke bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır.

Bununla birlikte Yatırım Programında yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ödenekleri ile 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yemekhanesi 2018 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Tirebolu İletişim Fakültesi ile Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Bünyelerinde laboratuvarlar, konferans salonları, donanımlı teknoloji sınıfı ve kütüphane mevcuttur. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokuluna bağlı bir bölüm Doğankent ilçemizde faaliyet göstermektedir.

Tirebolu İletişim Fakültesi binasının yapımı Yatırım Programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında tamamlanmış olup, stüdyo ve atölyelerinde eğitim-öğretim, uygulama amaçlı makine teçhizatlar Muhtelif İşler Projesi kapsamında satın alınmıştır.

Tablo.3 Mevcut Alanların Dağılımı

REKTÖRLÜK-FAKÜLTELER-YÜKSEKOKULLAR-ENSTİTÜLER	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M²		
	KAPALI ALANLAR	KAPALI ALANLAR TOPLAMI	KAMPÜS ALANLARI
Rektörlük Binası (Şehir)	1.809	1.809	1.290,85
Nizamiye Ön Blok (Hastane)	4.604	4.764	6.161,03
Nizamiye Arka Blok (Hastane İdari)	160		
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	1.176	13.734,90	13.491,32
Gazipaşa A Blok	2.792		
Gazipaşa C Blok	5.048		
Gazipaşa Tıp Fakültesi (Ak. Pers. Çalş. Oda)	820		
Gazipaşa MYO	1.355		
Gazipaşa B Blok	1.474		
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	150		
Gazipaşa Son Prefabrik	159,90		
Gazipaşa Prefabrik (Tıp Fak.)	592		
Mobilya Atölye Depo	53		
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	115		
Güre A-B-C Bloklar (Eği. Fak.)	5.360	100.461,60	161.878,99
Güre D-E Bloklar	4.250		
Güre F-G-H Bloklar (Eğt. Fak.)	5.280		
Güre Kütüphane Binası (teras ve balkon dahil)	6.562		
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056		
Güre Lojmanlar A-B-C-D-E-F BLOK	4.928		
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848		
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468		
Güre Prefabrik (Spor Bilimleri Fakültesi)	416		
Güre Isı Merkezi	202		
Güre Kreş	1.040		
Fen -Edebiyat Fakültesi	44.134		
Mühendislik Fakültesi	10.755		
Fen -Edebiyat Fakültesi Yemekhane	3.105		
Deney Hayvanları Laboratuvarı	259		
Güre Kafeterya	191		
Spor Bilimleri Fakültesi	7.712,60		
Ahmet Yılmaz Lojmanları	2.094	2.094	2.214,67
Teyyaredüzü	0	0	6.295,02
Teyyaredüzü	0	0	1.476,80
Sağlık yerleşkesi -AKSU	0	0	20.360
Seldeğirmeni	0	0	9.741,08
Güre Amfi	885	0	0
Şelale	613		
Sundurma Açık Otopark	240		
Sahil SET (Lojman)	672	2.204	5.211
Sahil SET (Kafeterya)	203		

Sahil SET (Rek. Kon.)	463		
Sahil SET (Havuz)	200		
Sahil SET(Apart Evler)	207		
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	459		
Turizm Fakültesi	468	468	286,87
Piraziz Sağlık Bilimleri Fak.	3.950	3.950	2.904,77
Bulancak UBYO	4.752	4.752	10.062,66
Bulancak-Fındık bahçesi	0	0	5.787,50
Bulancak-Fındık bahçesi	0	0	44.315,85
Keşap MYO	1.675	1.675	334
Keşap -Turizm Fakültesi	6.759	6.759	20.884
Espiye MYO (MEB)	3.760	7.084	2.854,34
Espiye MYO (SYDV)	3.324		1.856,26
Espiye -Adabük mevkii	0	0	13.159,30
Espiye -Adabük mevkii	0	0	8.293,66
Tirebolu MBMYO	2.600	2.600	4.592,32
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356	8.520	8.897,94
Çok Amaçlı Salon	1.164		
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	6.370	6.370	6.832,42
Görele UBYO	2.584	2.584	4.006
Eynesil KNMYO	4.089	4.089	3.946,72
Doğankent	5.226	5.226	965,25
Dereli MYO	0	0	0
Şebinkarahisar MYO (Teknik)	5.270	14.479,43	335.064,30
Şebinkarahisar İşlik	732,52		
Şebinkarahisar MYO (Sosyal)	2.720		
Şebin Kazan Dairesi	176,67		
Şebinkarahisar UBYO	3.733		
Şebinkarahisar Yemekhane	1.629,98		
Şebinkarahisar Fırın	217,26		
Alucra MYO	5.276	5.276	51.880
Yağlıdere Erol Çatalbaş MYO	2.253	2.253	3.749,73
Çamoluk	0	0	63.354,87
T O P L A M	**201.152,93**	**201.152,93**	**822.149,52**

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri merkez ve ilçelerde konuşlanmış 17 kampüs alanında yürütülmektedir. Üniversitemiz 822.149,52 m^2 araziye 201.152,93m^2 kapalı alana sahiptir. Bu durumda öğrenci başına 7,51 m^2 kapalı alan düşmektedir.

Üniversitemiz yerleşke alanlarına göre 335.064,30 m^2 taşınmaz arazisi ile en büyük yerleşkemizin Şebinkarahisar olduğu görülmektedir. İkinci büyük yerleşkemiz Güre Yerleşkesi olup, aynı zamanda en fazla öğrencinin bulunduğu yerleşkedir.

Halen Gazipaşa Yerleşkesinde Tıp Fakültesi ve bazı birimlerimizin eğitim-öğretim faaliyeti gösterdiği binalar 1960 yılından beri hizmet veren yaşlı ve yorgun binalardır. Bu nedenle Yatırım Programı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının yapımına Aksu mevkiinde 2020 yılında başlanmıştır. Neticede sağlık ile ilgili tüm birimlerin, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulunduğu Aksu mevkiinde yeni oluşturulacak kampüs alanında birleştirilmesi düşünülmektedir.

1.2.1) İnsan Kaynakları

2020 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 1.053 akademik, 378 idari personelimiz olduğu görülmektedir. Ayrıca 34 sözleşmeli personelimiz, 124 güvenlik personeli, 129 temizlik personeli olmak üzere toplam 1.718 personelimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2020 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Tablo.4 Üniversitemiz İnsan Kaynaklarının 2018-2019-2020 Yıllarına ait Bilgileri:

Gösterge	Cinsiyet	Yıllar	Kadrolu Personel						Sözleşmeli Personel		4-d Sürekli İşçiler*						Genel Toplam	
			Akademik Personel		İdari Personel		Geçici İşçi				Güvenlik Hizmetleri		Temizlik Hizmetleri		Diğer Hizmetler			
			Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)	Sayı	Dağılım (%)
Personel Sayısı	Kadın	2018	398	41,68%	140	37,94%	0	0	29	85,29%	12	10,43%	55	44,35%	0	0	634	39,70%
		2019	419	41,86%	143	38,03%	0	0	28	82,35%	12	10,43%	54	43,90%	0	0	656	39,78%
		2020	439	41,69%	143	37,83%	0	0	28	82,35%	16	12,90%	59	45,74%	0	0	685	39,87%
	Erkek	2018	557	58,32%	229	62,06%	0	0	5	14,71%	103	89,57%	69	55,65%	0	0	963	60,30%
		2019	582	58,14%	233	61,97%	0	0	6	17,65%	103	89,57%	69	56,10%	0	0	993	60,22%
		2020	614	58,31%	235	62,17%	0	0	6	17,65%	108	87,10%	70	54,26%	0	0	1033	60,13%
	Toplam	2018	955	100,00%	369	100,00%	0	0	34	100,00%	115	100,00%	124	100,00%	0	0	1597	100,00%
		2019	1001	100,00%	376	100,00%	0	0	34	100,00%	115	100,00%	123	100,00%	0	0	1649	100,00%
		2020	1053	100,00%	378	100,00%	0	0	34	100,00%	124	100,00%	129	100,00%	0	0	1718	100,00%

Üniversitemizde toplam 1053 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %33,34'ü Öğretim Görevlisi kadrosunda % 16,68'i araştırma görevlisi, %30,23'ü Doktor Öğretim Üyesi, % 10,80'i Doçent, % 8,53'ü Profesör kadrosundadır.

Tablo.5 Akademik Personele Ait Bilgiler:

2020 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYILARI			
	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	90	25	115
Doçent	114	28	142
Dr. Öğr. Üyesi	319	85	404
Öğretim Görevlisi	356	48	404
Araştırma Görevlisi	176	39	215
TOPLAM	**1055**	**225**	**1280**

İdari personel sayısı içerisindeki en büyük payı % 66,67 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içerisinde bir seyir izlememektedir.

Tablo.6 İdari Personele Ait Bilgiler:

2020 YILI İDARİ PERSONEL SAYILARI					
Sınıflara Göre	Kadroların Doluluk Oranına Göre		Cinsiyete Göre		Toplam
	Dolu	Boş	K	E	
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	252	226	99	153	478
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	41	165	34	7	206
Teknik Hizmetler Sınıfı	56	60	6	50	116
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	-	2	2	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	24	15	2	22	39
TOPLAM	**378**	**466**	**198**	**180**	**844**

1.2.2) Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyindeki Dağılımı

2020 yılsonu itibariyle Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 26.753'dür. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo.7 Öğrencilerin Fakülteler Düzeyinde Dağılımı

FAKÜLTELER/KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	-	-	-	-	-
Eğitim Fakültesi	1.589	839	302	157	2.887
Fen Edebiyat Fakültesi	914	604	360	371	2.249
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	95	80	-	-	175
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	510	829	165	387	1.891
İslami İlimler Fakültesi	376	159	256	183	974
Mühendislik Fakültesi	230	704	1	18	953
Sağlık Bilimleri Fakültesi	689	167	-	-	856
Spor Bilimleri Fakültesi	180	355	15	58	608
Tıp Fakültesi	244	231	-	-	475
Tirebolu İletişim Fakültesi	421	468	-	-	889
Turizm Fakültesi	46	70	-	-	116
TOPLAM	**5.294**	**4.506**	**1.099**	**1.174**	**12.073**

Tablo.8 Öğrencilerin Enstitüler Düzeyinde Dağılımı

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	253	237	-	-	490
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	34	32	-	-	66
Sosyal Bilimler Enstitüsü	500	444	38	71	1.053
TOPLAM	**787**	**713**	**38**	**71**	**1.609**

Tablo.9 Öğrencilerin Yüksekokul Düzeyinde Dağılımı

YÜKSEKOKULLAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	136	382	29	95	642
Görele Ubyo	163	188	90	76	517
Şebinkarahisar Ubyo	211	88	110	94	503
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Devlet Konservatuvarı	47	61			108
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	**557**	**719**	**229**	**265**	**1.770**

Tablo.10 Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu Düzeyinde Dağılımı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Alucra Turan Bulutçu MYO	301	267	21	34	623
Dereli MYO	160	154	-	-	314
Espiye MYO	351	357	148	276	1.132
Eynesil Kamil Nalbant MYO	502	53	414	39	1.008
Keşap MYO	165	198	18	83	464
Sağlık Hizmetleri MYO	904	365	414	252	1.935
Sosyal Bilimler MYO	549	567	173	252	1.541
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO	405	382	96	115	998
Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO	187	273	1	3	464
Teknik Bilimler MYO	419	957	170	441	1.987
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO	366	439	19	12	836
Bulancak Endüstriyel Sanatlar MYO	-	-	-	-	-
Piraziz MYO	-	-	-	-	-
TOPLAM	**4.309**	**4.012**	**1.474**	**1.507**	**11.301**
GENEL TOPLAM					**26.753**

1.3. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI// KALİTE ARTIŞI// İYİLEŞME

2020 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında** yürütülen Spor Bilimleri Fakültesi Binası (7990m^2) yapım işi 2020 yılı Aralık ayında tamamlanarak 193.162,93 m^2 olan kapalı alan kapasitesi 201.152,93 m^2'ye çıkarılmıştır.

Kampüs Altyapı projesi kapsamında yürütülen 230 m yol yapım işinin 100 m'lik kısmı tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yürütülen yemekhane Gayrimenkul Büyük Onarım alt projesinden aynı anda 1000 öğrencinin sağlıklı koşullarda yemek yiyebileceği yemekhane oluşturulmuştur.

Yine aynı proje kapsamında merkezi kütüphanede iki olan salon sayısı beş'e çıkarılmış ve 195 kişilik çalışma ve araştırma alanları oluşturulmuştur.

1.4. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemize 2020 yılı yatırım programı kapsamında, 06 Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği olarak yıllara sari iki, yıllık dört proje toplam altı proje için **9.200.000,00TL** tahsis edilmiştir.

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5. maddesi ve 2114 sayılı 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca likit karşılığı 11.675.000,00TL ödenek kaydı yapılmış ve Üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplam 20.875.000,00TL'ye ulaşmıştır.

Bu Ödeneğin 13.748.706,55TL'siharcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %65,86 olmuştur.

Tablo.11 Yatırım Projelerine Ait Genel Bilgiler

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2020YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2020 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2020 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2020 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	9.000.000,00	20.675.000,00	13.711.182,55	66,32
Eğitim/Beden Eğitimi Spor	1	200.000,00	200.000,00	37.524,00	18,76
TOPLAM	**6**	**9.200.000,00**	**20.875.000,00**	**13.748.706,55**	**65,86**

Grafik.2 Yatırım Projelerine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri

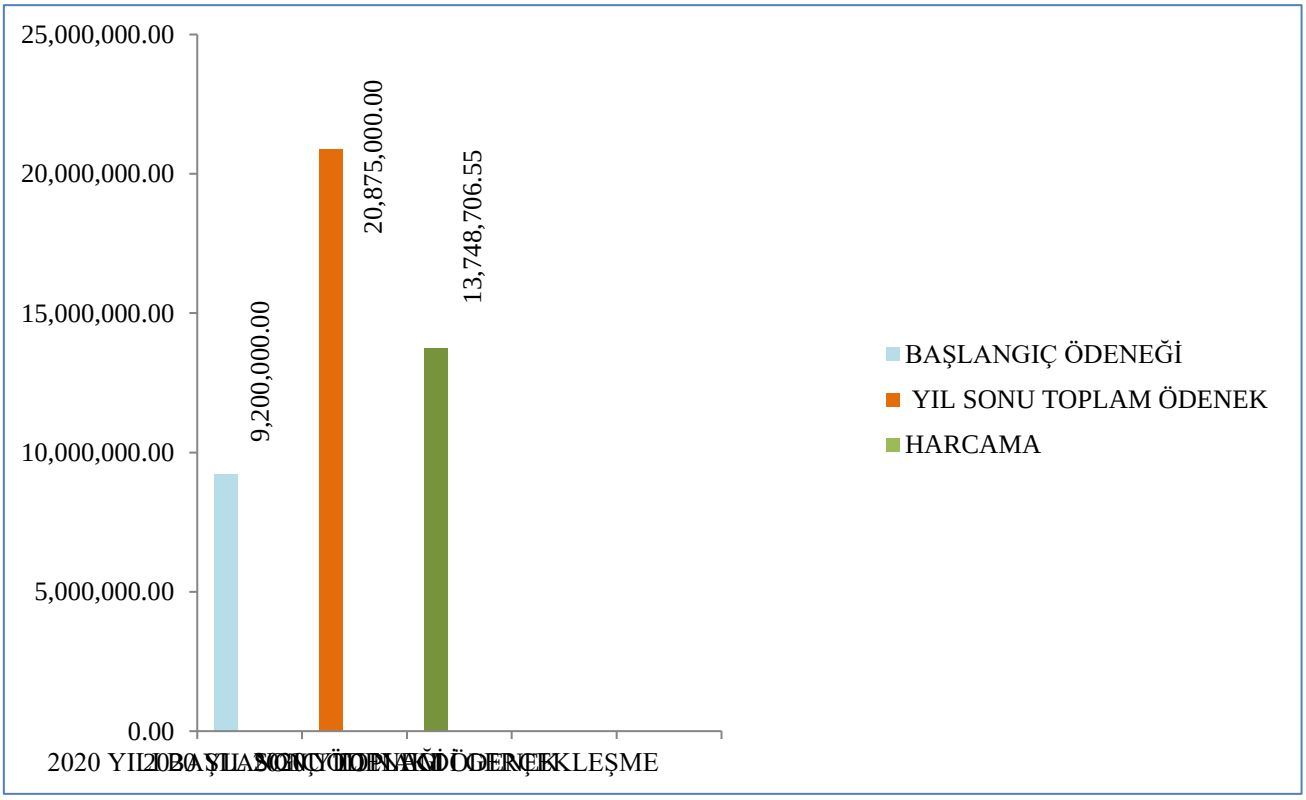

Tablo.12 2020 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2020 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	3.898.000,00	3.875.600,00	3.714.922,88	95,85
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	332.400,00	332.300,61	99,97
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.002.000,00	12.192.000,00	5.252.015,73	43,08
06.6	Bakım Onarım (Menkul)	100.000,00	100.000,00	99.987,30	99,99
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00	4.375.000,00	4.349.480,03	99,42
TOPLAM		**9.200.000,00**	**20.875.000,00**	**13.748.706,55**	**65,86**

Grafik.3 Yatırım Projelerinin Ekonomik Kod Bazında Ödenek ve Harcamaları

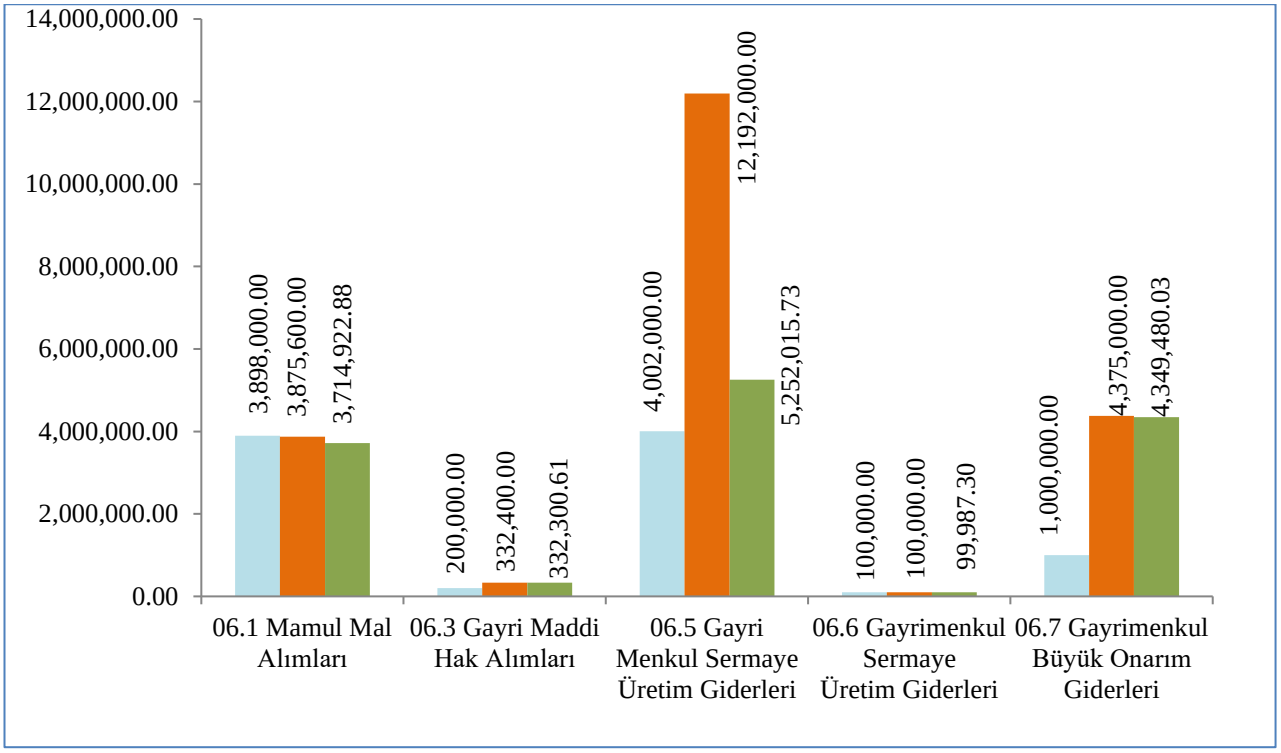

Tablo.13 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri Ve Harcama Tutarları

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME DURUMU %
01-Personel Giderleri	147.059.000,00	155.050.430,00	153.538.221,51	99,02
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	21.815.000,00	22.634.580,00	22.277.133,62	98,42
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.599.000,00	18.016.401,00	12.346.634,44	68,53
05-Cari Transferler	4.478.000,00	4.557.200,00	4.535.599,24	99,53
06-Sermaye Giderleri	9.200.000,00	20.875.000,00	13.748.706,55	65,86
TOPLAM	**198.151.000,00**	**221.133.611,00**	**203.446.308,28**	**93,36**

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere başlangıç ödeneğinin % 4,64'ünü, yılsonu toplam ödeneğin %9,44'ünü, toplam harcamanın da % 6,76'sını sermaye giderleri oluşturmaktadır.

Grafik.4 Toplam Ödenek/Sermaye Ödeneklerinin Karşılaştırılması

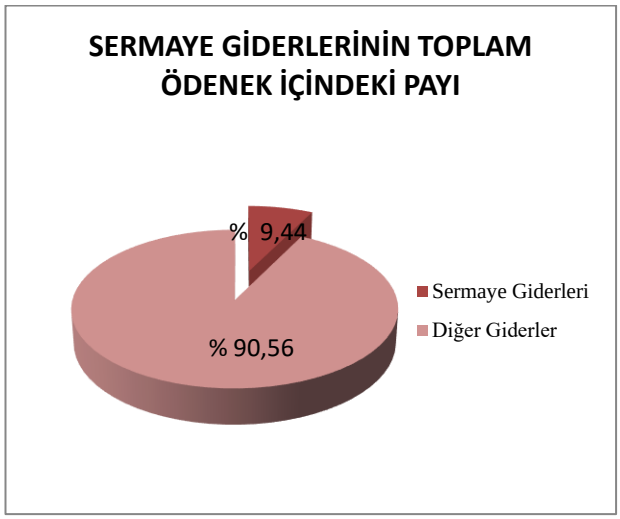

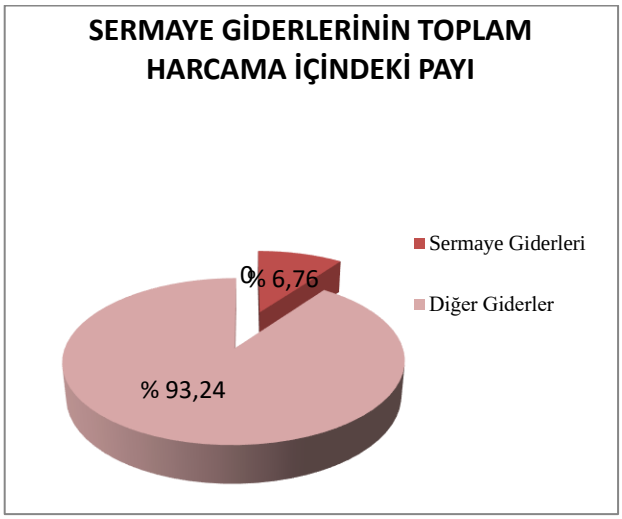

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2020 yılında yatırım programı kapsamında toplam altı proje yürütmüştür. Bunlardan beş proje eğitim/yükseköğretim sektörüne, bir proje eğitim/beden eğitimi ve spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo.14 2020 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YILSONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ				
2020H03-151073	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DOKAP)	100.000,00	36.580,00	36.580,00
1. 2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)	3.780.000,00	9.955.000,00	3.092.000,00
2. 2020H03-151075	Kampüs Alt Yapısı(DOKAP)	1.500.000,00	1.948.420,00	1.913.537,28
3. 2020H03-151069	Muhtelif İşler(DOKAP)	2.420.000,00	7.539.500,00	7.473.763,84
4. **2020H05**-151079	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DOKAP)	200.000,00	200.000,00	37.524,00
5. 2020H03-151041	Yayın Alımı(DOKAP)	1.200.000,00	1.195.500,00	1.195.301,43
GENEL TOPLAM		**9.200.000,00**	**20.875.000,00**	**13.748.706,55**

Tablo.15 2020 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri ve Alt Projeleri

PROJE ADI		ALT PROJELER	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM HARCAMA
2020H05-151079	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	Spor Salonu Bakım Onarım Makine-Teç.	200.000,00	200.000,00	37.524,00	37.524,00
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	Spor Bilimleri Fakültesi Binası	3.778.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	3.092.000,00
		Morfoloji.	2.000,00	7.502.000,00	639.000,00	
2020H03-151075	Kampüs Altyapısı	Kampüs Altyapısı	1.500.000,00	1.948.420,00	1.913.537,28	1.913.537,28
2020H03-151069	Muhtelif İşler (DOKAP)	Bakım Onarım (Gayrimenkul)	750.000,00	4.375.000,00	4.349.480,08	7.473.763,84
		Bakım Onarım (Menkul)	100.000,00	100.000,00	99.987,30	
		Bilgi ve İletişim Teknolojileri	200.000,00	332.400,00	332.300,61	
		Erişilebilirlik	250.000,00	250.000,00	209.898,40	
		Makine-Teçhizat	1.120.000,00	2.482.100,00	2.482.097,45	
2020H03-151073	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt Proje	100.000,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00
2020H03-151041	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı	80.000,00	75.500,00	68.273,26	1.195.301,43
		Elektronik Yayın Alımı	1.120.000,00	1.120.000,00	1.127.028,17	
TOPLAM			**9.200.000**	**20.875.000**	**10.585.768,65**	**13.748.706,55**

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1.a) Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2008H03-929
PROJE TUTARI	69.170.851,00TL
PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ	3.780.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	9.955.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Bilimleri Fakültesi (7.990m^2)-Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400 m^2)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2023
2020 YILI HARCAMASI	3.092.000,00 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%31,05

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2020 yılı için 3.780.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan ilavelerle proje ödeneği 9.955.000,00 TL' ye ulaşmıştır.

2008-2023 yıllarını kapsayan Projenin 2020 yıl sonu kümülatif harcaması 21.210.384,00TL'dir. Bu proje detayında Spor Bilimleri Fakültesi (7.990m^2) ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400 m^2) yapım işi iki ayrı alt proje olarak yer almaktadır.

Projenin 2020 yılsonu harcaması 3.092.000,00TL olup harcamanın ödeneğine oranı %31,05'dir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise % 26,83'dür.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi detaylarında alt proje olarak yürütülen Spor Bilimleri Fakültesi Binası yapım işi kapsamında fakülte binası ve spor salonunun yapımı 2020 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır.

2020 yılı yatırım programında 19.400m^2 olarak yer alan **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** yapım işine TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Aksu mevkiinde Üniversitemize ait alan üzerinde konuşlandırılacaktır.

2.1.1.b) Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

PROJE NO	**2020H03-151075**
PROJE TUTARI	7.000.000,00 TL
PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ	1.500.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	1.948.420,00TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2022
2020 YILI HARCAMASI	1.913.537,28TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%98,20

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesine 2020 yılı itibariyle proje tutarı olarak 1.500.000,00 TL tahsis edilmiş olup, yapılan ilavelerle proje ödeneği 1.948.420,00 TL' ye ulaşmıştır. Proje 2020-2022 yıllarını kapsamaktadır. Bu proje detayına 2020 yılı için doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işleri alınmış olup, Projenin 2020 yıl sonu kümülatif harcaması 1.919.537,28TL, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %98,20'dir.

Bu proje kapsamında; Güre yerleşkesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin konuşlandığı arazi arasında, öğrenci, araç, acil durumlarda itfaiye, polis, ambulans ve iş makinesi erişimini sağlayacak karayolu yapım çalışmalarının bir kısmı yürütülmüştür.

2.1.2 Özel Sektör/ Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Üniversitemizde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği içinde yürütülen yatırım projesi bulunmamaktadır.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

1.2020H05-151079 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi(DOKAP)

2. 2020H03-151073 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

3. 2020H03-151069 Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

4. 2020H03-151041 Yayın Alımı

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

2.2.2.1.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H05-151079					
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor					
Alt Proje No	2020H05-151079					
Alt Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Proje Amacı	Spor Tesislerinin Bak. On. ve Mak. Teç.					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Bakım Onarım - Makine Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
					200	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					38	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/ Sonucu (Ürünü)	Makine/teçhizat alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Başta Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere eğitim-öğretim/araştırma Faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan makine-tec. ve spor malzemeleri temin edilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2020 yılı itibariyle proje tutarı olarak 200.000,00 TL tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 37.524,00TL Spor Bilimleri Fakültesi için spor mal/malzemesi alımı yapılmıştır.Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise % 18,76'dır.

2.2.2.2.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151073					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No						
Alt Proje Adı						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-BitişTarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			37	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 YılıFiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					37	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/ Sonucu (Ürünü)	Proje İşleri					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'ne 2020 yılı itibariyle proje tutarı olarak 100.000,00 TL tahsis edilmiş olup, projeler arası aktarmalarla yılsonu revize proje ödeneği 36.580,00 TL' ye düşmüştür. Revize edilen ödeneğin 2020 yılsonu harcaması 36.580,00 TL'dir. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

2.2.2.3. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2020H03-151069
PROJE TUTARI	2.420.000,00 TL
PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ	2.420.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	7.539.500,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2020
2020 YILI HARCAMASI	7.473.763,84TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,13

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi: Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt projeler kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir.

Proje tutarı olarak 2.420.000,00TL tahsis edilmiş olup yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 5.119.500,00TL ödenek ilavesi yapılarak revize ödeneği 7.539.500,00TL olmuştur. Projenin 2020 yıl sonu harcaması 7.473.763,84TL olup harcamanın ödeneğe oranı %99,13'dür.

Bu proje kapsamında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Alt Projeler;

2.2.2.3.a)Muhtelif İşler - Bakım Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151069					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2020H03-151069-153603					
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler – Bakım Onarım					
Proje Amacı	Bakım Onarım					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Büyük Bakım Onarım					
Fiziki Hedefi						
Başlama-BitişTarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		850			4.475	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					4.450	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
ProjeÇıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemizin Muhtelif Birimlerinde Yaptırılacak Bakım Onarım Faaliyetleri İçin Malzeme Alımı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Tirebolu İletişim Fakültesinde Bulunan iki UPS Cihazına Akü Alımı Rektörlük, Bulancak Kadir Karabaş Uyg. Bil. ve Espiye MYO Binalarında İmalatlar ve Muhtelif Bakım-Onarımlar Yaptırılması Çamlık Lojmanlarının Bulunduğu Alandaki Su Deposunun Alt Kısmında Bulunan Hidroforun Yan Binadaki Kazan Dairesine Taşınıp Tesisatının Aktif Hale Getirilmesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Ortak Kullandığı Binada Bazı Dersliklerin Pandemi Tedbirleri ile Küçültülmesi, Konferans Salonunda Tadilat Yaptırılması, Pencere Doğramalarının Değiştirilmesi, Su Alan Yerlerin Yalıtımının Yapılması,Rahle Yapılması, Aynı Binanın Bodrum Katında Kapı Açılması ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Bodrum katının yemekhaneye dönüştürülmesi Güre Yerleşkesinde Muhtelif Sınıflara Boya Yapılması, Alüminyum Doğramalı Pencerelerin Çift Açılır (Yana ve Üstten Açılır) Yapılması Çeşitli Birimlerde Kalorifer Tesisatı ve Pisuar Musluklarının Değiştirilmesi Tuvaletlerdeki Sorunların Giderilmesi, Klima Bakım Onarım Montaj ve Demontajı, Pompa Hidrofor Bakım Onarımı Eynesil Kamil Nalbant M.Y.O. Asansörünün Revizyon Yapılması ve Muhtelif Asansörlerde Onarım Yapılması Eğitim Fakültesi ve Rektörlük Binasında Muhtelif Tadilatlar Yaptırılması Görele Güzel Sanatlar Fakülte Binasının Zemin Katında Alçıpan Malzeme İle Bölme Duvar ve Çalışma Odası Yaptırılması, Havalandırma Bacası (Aspiratör) Yapımı Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Doğankent Veysi Akın Koloğlu Ek Hizmet Binası Elektrik Onarım Birimlerde İhtiyaç Duyulan Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı Üniversitemiz Şebinkarahisar Teknik Bilimler M.Y.O. 10Kw UPS Cihazının Akü Gruplarının Yenilenmesi Gazipaşa Yerleşkesinde Bulunan Sosyal Bilimler MYO'nun Kullanmakta Olduğu C Blok 2. Kattaki İki Adet Bay WC'nin Yenilenmesi Merkez Kütüphane Binasında iyileşme ve imalat işlerinin yapılması Giresun Üniversitesi Rektörlük Binası 60kVA UPS Cihazına Akü Alımı Giresun Üniversitesine Bağlı Birimlerde Kullanılan Ups Cihazlarının Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı Üniversitemize Ait Muhtelif Birimlerde Harita İşi Yaptırılması Gazipaşa Yerleşkesi C Giriş Kapısı İçin İhtiyaç Duyulan Bariyer Kapı Alımı Fotokopi Makinesi Bakım Onarımı Birimlermizdeki 24 Adet UPS cihazının bakım onarım ve elektrik tesisatı işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerinde kalite artışı
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Alt Projeler:

2.2.2.3.b)Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişim Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151069					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2020H03-151069-153577					
Alt Proje Adı	Bilgi ve İletişimTeknolojileri					
Proje Amacı	Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		200			335	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					332	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Personel Otomasyon Yazılım 2020 Yılı Güncellemesi Logsign Yazılım Programının 2020 Yılı Güncellemesi Ünipa Otomasyon Sisteminin 2020 Yılı Güncellemesi Yordam Kütüphane Otomasyon Programının 2020 Yılı Güncellemesi E-Hakediş Yazılım Programının (10 Kullanıcılı) Ve E-Kiknet Programının 2020 Yılı Güncellemesi Belgenet Uygulamasının 01.11.2019-01.11.2020 Tarihleri Arası Garanti Bakım Hizmeti UZEM Birimimizde Kullanılan Moodle Tier2 Support&Maintenance Hizmet İşi 						

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

2.2.2.3.c) Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151069					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2020H03-151069-153579					
Alt Proje Adı	Makine -Teçhizat Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.120			2.482	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					2.482	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						

Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İlaçlama Körüğü Alımı Ateş Ölçer Alımı (5 Adet) Tablet Alımı Isı Takip Sistemi Alımı Kablo, Mouse ve Yazılım Kartı Alımı 2 Adet Klima ve 1 Adet Bulaşık Makinesi Alımı Temizlik Arabaları İçin 5 Adet Akü Alımı 37 Adet Öğrenci Sırası Oturma Modülü Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazı Alımı 38 Adet Dezenfenktan Standı Alımı 16 Adet Kamera-1 Adet Kayıt Cihazı-1 Adet Switch Ve 780 M Kablo Alımı Buharlı Sterilazator Alımı 21 Adet Bilgisayar, 20 Adet Koltuk, 6 Adet Erişim Noktası ve 1 Adet Switch Perde Alımı
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Makine Teçhizat Alımı
Projenin Kalkın Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2.2.2.4) Yayın Alımı Projesi

PROJE NO	2020H03-151041
PROJE TUTARI	1.200.000,00 TL
PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ	1.200.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	1.195.500,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2020
2020 YILI HARCAMASI	1.195.301,43TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,98

Üniversitemizin iki alt proje üzerinden yürütülen Yayın Alımı Projesinin, 2020 yılı başlangıç ödeneği 1.200.000,00TL, revize yılsonu ödeneği 1.195.500,00TL, yılsonu harcaması ise 1.195.301,43 TL'dir. Alt projeler düzeyinde Basılı Yayın Alımı projesinin başlangıç ödeneği 80.000,00TL revize ödeneği 75.500,00TL, yılsonu harcaması 68.273,26TL'dir. Elektronik Yayın Alımı alt projesinin başlangıç ödeneği 1.120.000,00TL, yılsonu harcaması 1.127.028.17TL'dir. Basılı Yayın Alımı projesinin yılsonuna kadar harcanmayacağı tespit edilen 4.500,00TL ödeneği Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %99,98 olarak gerçekleşmiştir.

2.2.2.4.a) Yayın Alımı - Basılı Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151041					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2020H03-151041-151042					
Alt Proje Adı	Basılı Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		80			75	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					68	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Basılı Yayın alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2.2.2.4.b) Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151041					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2020H03-151041-153574					
Alt Proje Adı	Elektronik Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.120			1.120	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					1.127	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Elektronik yayın alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç
(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2.2.2.5.a) Proje Tamamlama Raporu

ProjeninYatırımProgramıParametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2008H03-929					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2008H03-929-21193					
Alt Proje Adı	Spor Bilimleri Fakültesi Binası					
Proje Amacı	Eğitim Tesisi					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Eğitim (7990m^2)					
Fiziki Hedefi	7990 m^2					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli	21.896		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
					20.571	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (….)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2017						
2018					9.566	
2019					8.852	
2020					2.453	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Spor Bilimleri Fakültesi Binası (7990m^2)					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı, çağdaş fakülte binası ve Spor salonu ile buluşturulması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

3.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemize; 12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı(Mükerrer) Resmî Gazete'de Yayımlanan 2114 Sayılı 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Eki "2020 Yılı Yatırım Programı" ile altı adet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir. Eğitim Sektörü altında yer alan bu projelerin, beş tanesi Eğitim/Yükseköğretim bir tanesi, Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor alt sektörlerindedir. Eğitim/ Yükseköğretim alt sektöründe yer alan beş projenin üç tanesi yeni proje, iki tanesi yıllara sari, Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor alt sektöründeki bir proje ise yeni proje olarak yürütülmüştür.

Bu projelerin uygulanması aşamasında karşılaşılan temel sorunlar ve çözüme yönelik önerilerimiz aşağıda belirtilmektedir;

Yıllara sari yürütülen 2020 yılı revize ödeneği 9.955.000,00 TL olan **2008H03-929 nolu Derslik ve Merkezi Birimler** projesinin alt projesi olarak yürütülen uygulama aşamasında TOKİ tarafından zemin iyileştirilmesi gerektiği bildirilmiş, bu bağlamda 47.200.000,00 TL olan proje maliyetine fore kazık işi için 10.620.000,00 TL ilave edilerek proje maliyeti 57.820.000,00 TL olarak revize edilmiştir. Aynı projenin Spor Bilimleri Fakültesi alt projesinin uygulama aşamasında inşaat alanına izin alınarak mülkiyeti özel şahıslarda olan arazilerden ulaşım sağlanmış ancak inşaat bittiğinde erişim izni kaldırılmıştır. Bu bağlamda zorunlu nedenlerle (İtfaiye, Ambulans, İç ve Dış Paydaşların Geçişi) Güre Yerleşkesi ile Spor Bilimleri Fakültesi arasında 100 m'si Üniversitemiz mülkiyetinde 130 m'si özel mülkiyette olan arazilerden toplam 230 m yeni bir karayolu güzergahı belirlenmiştir. Karayolunun tamamlanabilmesi için Kampüs Altyapısı projesine ödenek ilave edilerek planlanan karayolunun Üniversitemiz mülkiyetindeki 100 m'lik kısmı tamamlanmıştır. Özel şahısların mülkiyetindeki 1703/99 parsel için Strateji ve Bütçe Başkanlığından kamulaştırma izni istenmesi planlanmıştır.

2020H03-151075 nolu Kampüs Altyapısı projesinin 1.500.000,00 TL olan başlangıç ödeneğine yıl içinde duyulan ihtiyaçlar nedeniyle 448.420,00 TL ilave edilerek revize ödeneği 1.948.420,00 TL'ye yükseltilmiştir. Bu ödeneklerle kampüs içi yol, doğalgaz hattı ve çevre düzenlemesi işleri yapılmıştır.

2020H03-151073 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 100.000,00 TL olan ödeneğinden 63.420,00 TL projeler arası aktarılarak proje ödeneği 36.580,00 TL olmuştur. Yıl içinde ihtiyaç duyulan etüt proje işlemleri bu ödeneklerle tamamlanmıştır.

2020H03-151041 nolu Yayın Alımı Projesinin 1.200.000,00 TL olan ödeneğinden 4.500,00TL aktarılarak1.195.500,00TL olarak revize edilmiş ve yıl içinde basılı ve elektronik yayın alımı bu ödeneklerle tamamlanmıştır.

2020H03-151069 nolu Muhtelif İşler Projesinin 7.539.500,00 TL olan yılsonu ödeneği 5 alt proje üzerinden yürütülmüştür. Alt projelerden;

2020H03-151069-153603 nolu Bakım Onarım projesi kapsamında gayrimenkul ve menkul malların bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir. Alt projede Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri için ayrılan 750.000,00TL'ye 3.625.000,00 TL aktarılmış, revize ödeneği 4.375.000,00 TL olmuştur. Bu sayede, Merkez Kütüphane Binasında faaliyet gösteren öğrenci yemekhanesi iptal edilmiş, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler Fakültelerinin ortak kullandığı binanın giriş katında, idame ve yenileme çalışmaları yaptırılmış ve 1000 öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği hijyen koşullarına uygun geniş ve ferah öğrenci yemekhanesi oluşturulmuştur. Merkez Kütüphane

Binasında öğrenci yemekhanesinin boşalttığı alanlar ile boş ve atıl açık alanlarda iyileşme, yenileme ve idame çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Neticede Kütüphanemize beş çalışma salonu, aynı anda 20 kişinin yararlanabileceği bilgisayar salonu ve 195 kişilik çalışma ve araştırma alanları kazandırılmıştır. Aynı alt proje kapsamında, Menkul Mal Alım Bakım Onarım giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneklerle Merkezde faaliyet gösteren birimlerimizin asansör, klima bakımı ile tüm birimlerimizin jeneratör bakımları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllar için dağınık şekilde konuşlanan hizmet binaları nedeniyle bu alt proje ödeneklerinin artırılması gerektiği tespit edilmiştir.
2020H03-151069-153579 nolu Makine Teçhizat Alımları alt projesinin 1.120.000,00 TL olan başlangıç ödeneğine 1.362.100,00 TL aktarılmış ve revize ödeneği 2.482.100,00 TL olmuştur. Bu alt proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda makine-teçhizat, laboratuvar cihazları, büro mefruşatı vb. alımları gerçekleştirilmiştir.
2020H03-151069-153577 nolu Bilgi ve İletişim Teknolojileri projesinin 200.000,00 TL başlangıç ödeneğine 132.400,00 TL aktarılmış ve revize ödeneği 332.400,00 TL olmuştur. 2020 yılında COVİD-19 salgını eğitim-öğretimin uzaktan bilişim teknolojileri ile yapılmasını gerekli kılmış ve bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerine daha çok yatırım yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
2020H03-151069-153603 nolu Engellilerin Erişilebilirliği alt projesi sorunsuz şekilde yürütülmüştür.

2020H05-151079 noluAçık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin makine teçhizat alt projesi sorunsuz bir şekilde yürütülürken, Spor Salonu alt projesinde arazi kamulaştırma işlemleri tamamlanamamıştır. Bu sorun nedeniyle, Dünyanın ve Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen **26.753** öğrencinin buluştuğu Giresun Üniversitesine, tavan yüksekliği uluslararası standartlarda olan bir spor salonu kazandırılamamıştır.

Bu bağlamda,

Yatırım Programı kapsamında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin, onaylanan Ayrıntılı Finansman Programında üçüncü, üç aylık dilime kadar tamamının serbest bırakılmasının sağlanması.

Yatırım programına alınacak projelerin ve ödeneklerinin Üniversitemiz yatırım teklifine göre belirlenmesi,

Muhtelif işler projesi kapsamında ödenek tahsis edilirken "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşulların ve Engellilerin Erişebilirliği Projesinin göz önüne alınması,

Yatırım Programı kapsamında Ar-Ge projesi olarak yapımı tamamlanan ve eğitim- öğretim süreçlerinde yoğunlukla yükseklisans-doktora aşamalarında yararlanılan Merkezi Araştırma Laboratuvarları için Ar-Ge sektöründen muhtelif işler projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi önerilmektedir.

4. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		85.142			19.493			9.200			20.875			13.749
D.KamuHiz															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	**6**		**85.142**			**19.493**			**9.200**			**20.875**			**13.749**

HAZIRLAYANLAR

Muammer ÖĞRETİCİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube Müdürü

Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni
